Справка по мониторингу работ по рекультивации городского полигона захоронения твердых коммунальных отходов «Центролит» (15.08.2024)

Основание выезда:

В соответствии со ст. 9 федерального закона РФ от 21.07.2005 № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях», п.п. 65, 66 раздела XI концессионного соглашения от 10.06.2010, заключенного между муниципальным образованием город Липецк (далее – Концедент) и АО «ЭкоПром –Липецк» (далее – Концессионер) города Липецка (далее - концессионное соглашение), в целях осуществления контроля за исполнением Концессионером условий, в части проведения технического этапа работ по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления на городском полигоне захоронения твердых бытовых отходов в виде брикетов на территории бывших отстойников хозфекальных стоков «Центролит» (далее – полигон «Центролит»), расположенных по адресу: г. Липецк, ул.Юношеская, сооружение 90.

Сотрудники администрации г. Липецка:

- Заместитель председателя-начальник управления стратегического развития департамента экономического развития Н.И.Игнатенко.

Организация работы по рекультивации:

Проведение работ по рекультивации земель, нарушенных при складировании отходов производства и потребления на полигоне «Центролит», осуществляется на основании:

1. Договора № 21/06 на проведение работ по рекультивации земель, нарушенных при складировании отходов производства и потребления на городском полигоне захоронения твердых бытовых отходов на территории бывших отстойников хозфекальных стоков завода «Центролит» (полигон «Центролит»), заключен 21.06.2023 с ООО «Классторг», сроком действия договора до **31.12.2023**.
2. Договора на выполнение работ по рекультивации № 05/09/23 от 05.09.2023, заключенного с ООО «Классторг», сроком действия по 31.12.2023, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2023 срок действия договора продлен до 15.05.2024, с учетом дополнительного соглашения № 2 от 15.05.2024 срок действия договора продлен до 31.12.2024.
3. Договора на выполнение работ по рекультивации № 19/06-2024 от 19.06.2024 заключенного с ООО «Классторг», сроком действия до 31.12.2024.

Гарантийный срок выполненных работ до 01.01.2025.

Календарный график работ:

№ пп	Период времени	Вид работ по Договору № 21/06 от 21.06.2023	Ход работ
1.	26.06.2023-28.06.2023	плановая и высотная привязка территории	**выполнено**
2.	29.06.2023-15.08.2023	подъем обрушенных брикетов	**выполнено**
		выполаживание откосов и планировка территории	**выполнено**
		формирование основной дороги	**выполнено**
3.	**10.07.2023-15.09.2023**	**устройство нижнего подстилающего слоя из плотных суглинков, с учетом подготовительных работ**	**ведутся работы**
4.	**08.08.2023-15.10.2023**	**устройство верхнего слоя из плодородного грунта, с учетом подготовительных работ**	**ведутся работы**
Вид работ по Договору № 05/09/23 от 05.09.2023			
5	**05.09.2023-30.11.2023**	**Выполаживание откосов (Северная, Западная Восточная части) включая укладку изолирующего слоя**	**работы по выполаживанию откосов завершены, ведутся работы по укладке изолирующего слоя**
6	**01.01.2024 28.02.2024**	**Вывод высоты полигона «Центролит» на отметку согласно проекту рекультивации земель 20.03.00-ПРЗ**	**выполнено**
7	**01.01.2024 28.02.2024**	**Завершение выполаживания откосов со стороны ул. Юношеская**	**выполнено**
8	**01.01.2024 28.02.2024**	**Завершение выполаживания откосов западной части**	**выполнено**
9	**01.01.2024 28.02.2024**	**Завершение выполаживания откосов со стороны пруда-накопителя**	**выполнено**
10	**до 01.04.2024**	**Устройство дороги на теле полигона «Центролит» (вырезка ТКО и устройство)**	**ведутся работы**
11	**до 01.04.2024**	**Завершение выполаживания откосов южной и восточной части**	**выполнено**
12	**до 10.04.2024**	**Формирование «шапки» на середине горизонтальной части полигона «Центролит»**	**выполнено**
13	**до 15.08.2024**	**Завоз изолирующего слоя грунта и планировка территории полигона «Центроит»**	**ведутся работы**
14	**до 15.05.2024**	**Устройство дамбы по периметру водоотводного лотка**	**выполнено**
Вид работ по Договору № 19/06-2024 от 19.06.2024			
1	**до 29.07.2024**	**Комплекс работ по устройству нижнего рекультивационного слоя из глинистого грунта с коэффициентом фильтрации не более 10(-3) см/с**	**ведутся работы**
2	**До 15.08.2024**	**Комплекс работ по устройству верхнего рекультивационного слоя из плодородной почты**	**ведутся работы**
3	**До 15.08.2024**	**Перенос опор освещения**	**ведутся работы**

Календарный график работ по проекту:

№ пп	Наименование работ	Продолжительность, раб. дней
1.	**Подготовительный этап**	**10**
2.	**Технический этап**	**63**
2.1	Доставка изолирующего и растительного грунта	63
2.2	Комплекс работ по перемещению формированию и планировке	
3.	**Биологический этап**	**4 года**
3.1	Подготовка почвы	1 год
3.2	Дискование	
3.3	Внесение удобрений	
3.4	Выкашивание луговых газонов	3 года
3.5	Дискование	
3.6	Полив газонов поливочной машиной	
3.7	Внесение удобрений	

По состоянию на 15.08.2024:

Из запланированных работ полностью выполнены работы по формированию тела полигона «Центролит».

Проводится изоляция грунтом откосов полигона.

Ведутся работы по устройству нижнего рекультивационного слоя – выполнение работ со стороны улицы Юношеской составляет – 100%, со стороны пруда накопителя – 100%, со стороны с. Косыревка – 100%, зарадной стороны – 20%. Горизонтальная поверхность полигона – 90%.

Осуществляется завоз глинистого и плодородного грунтов.

Количество техники на объекте:

Работает 8 единицы техники.

Технический этап рекультивации				
Наименование техники	Количество по проекту, шт	Фактическое количество, шт	Область применения	Примечание
Самосвал	20	5	Доставка грунта	*рядом с полигоном, не работает
Бульдозер	2	1	Перемещение грунтов	
Каток	1	0	Уплотнение грунтов	
Экскаватор	2	2	Планировочные работы	*рядом с полигоном, не работает

14.07.2023

31.07.2023

14.08.2023

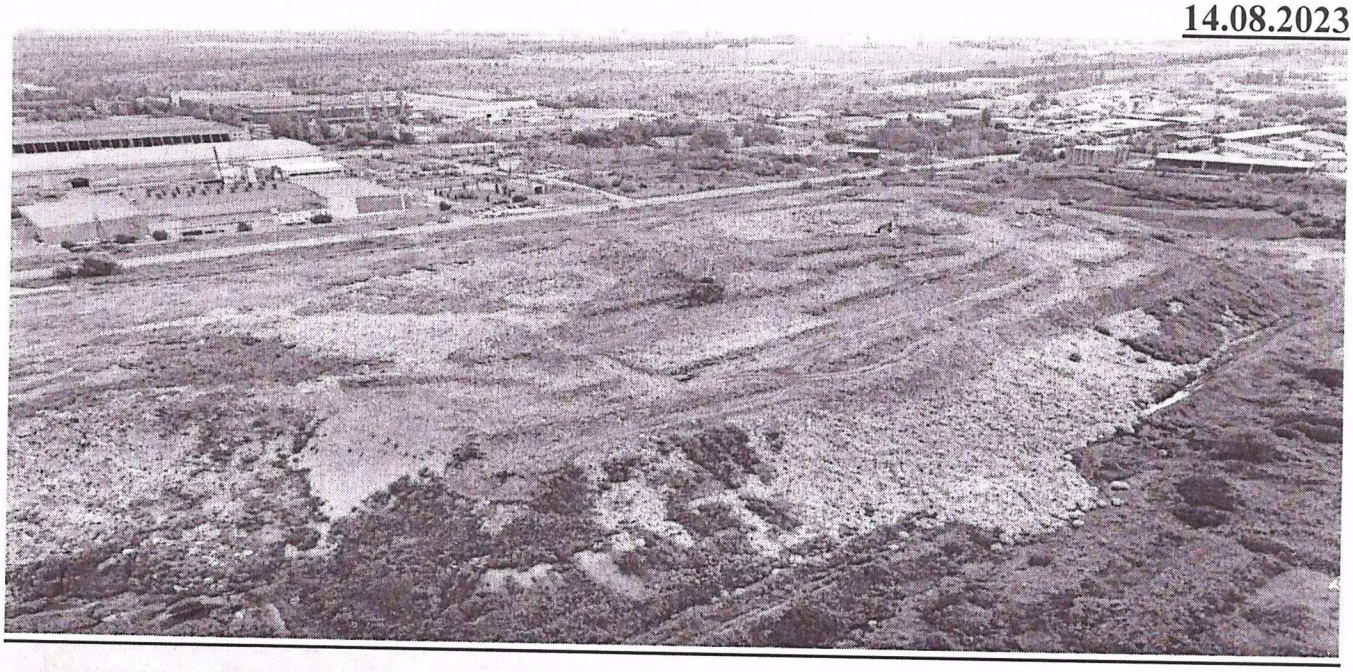

28.08.2023

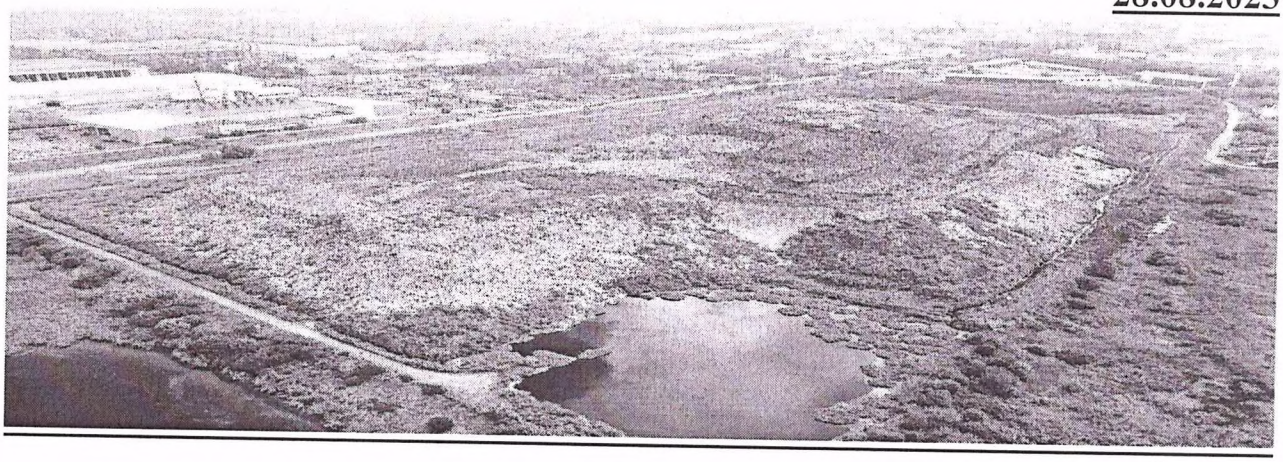

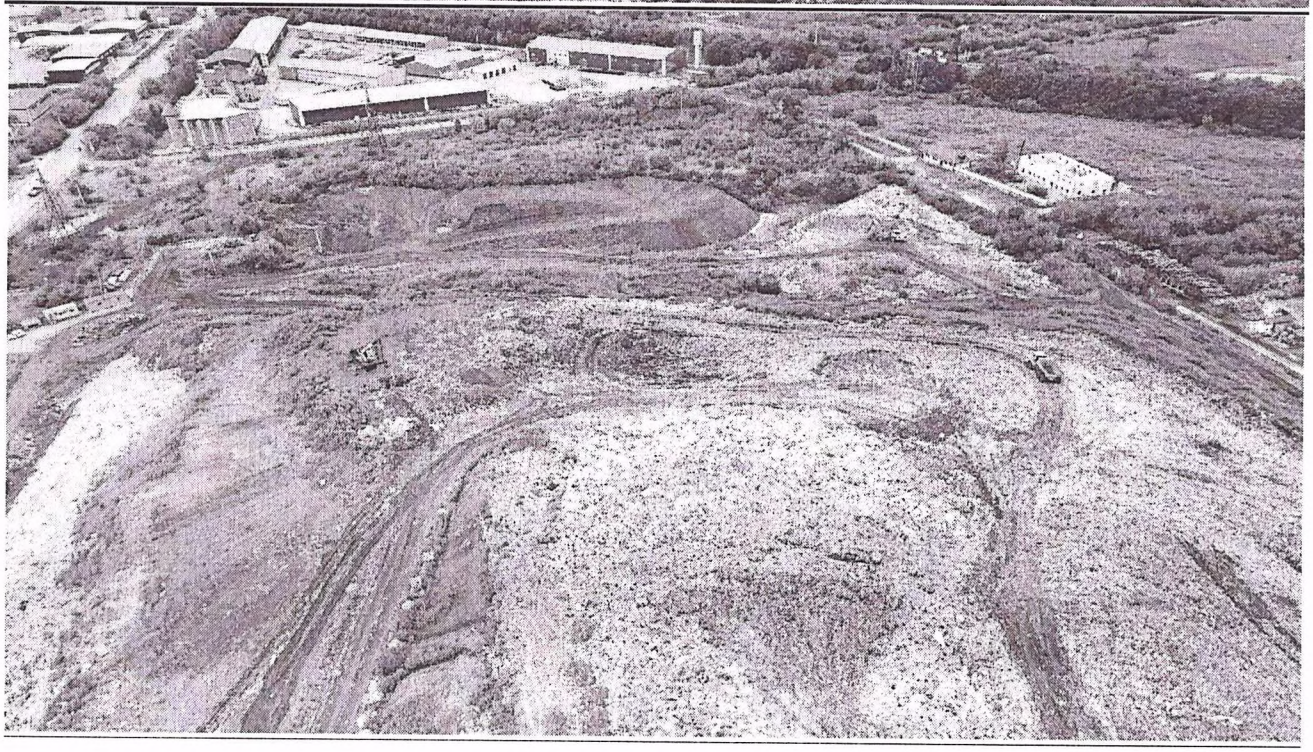

11.09.2023

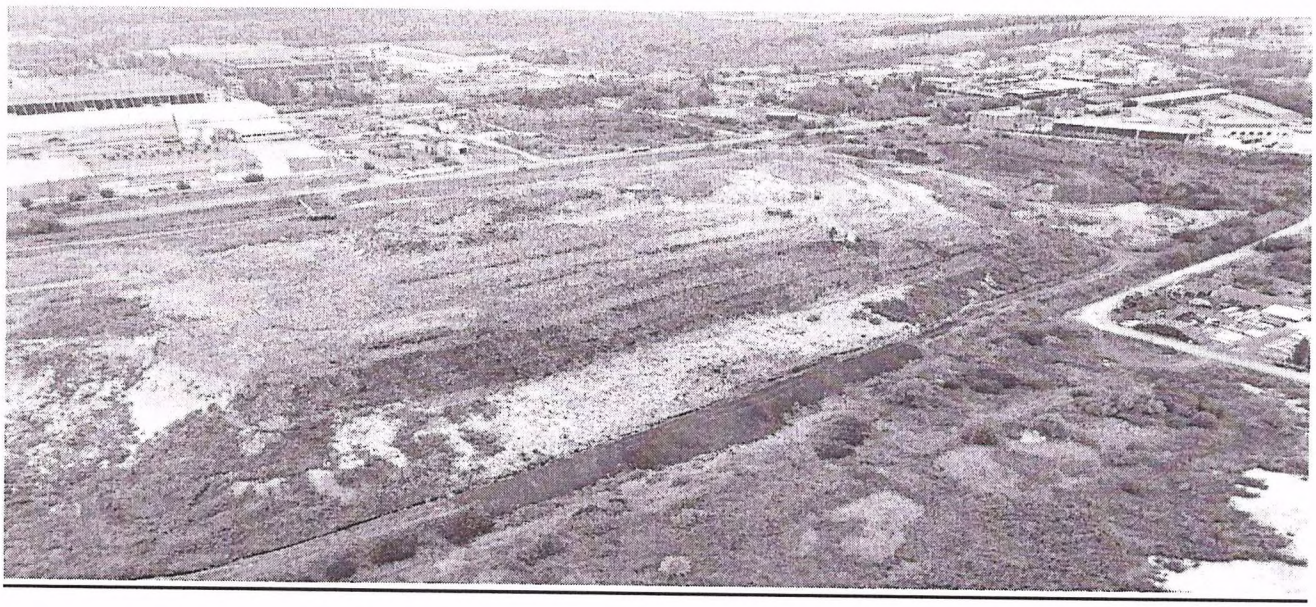

25.09.2023

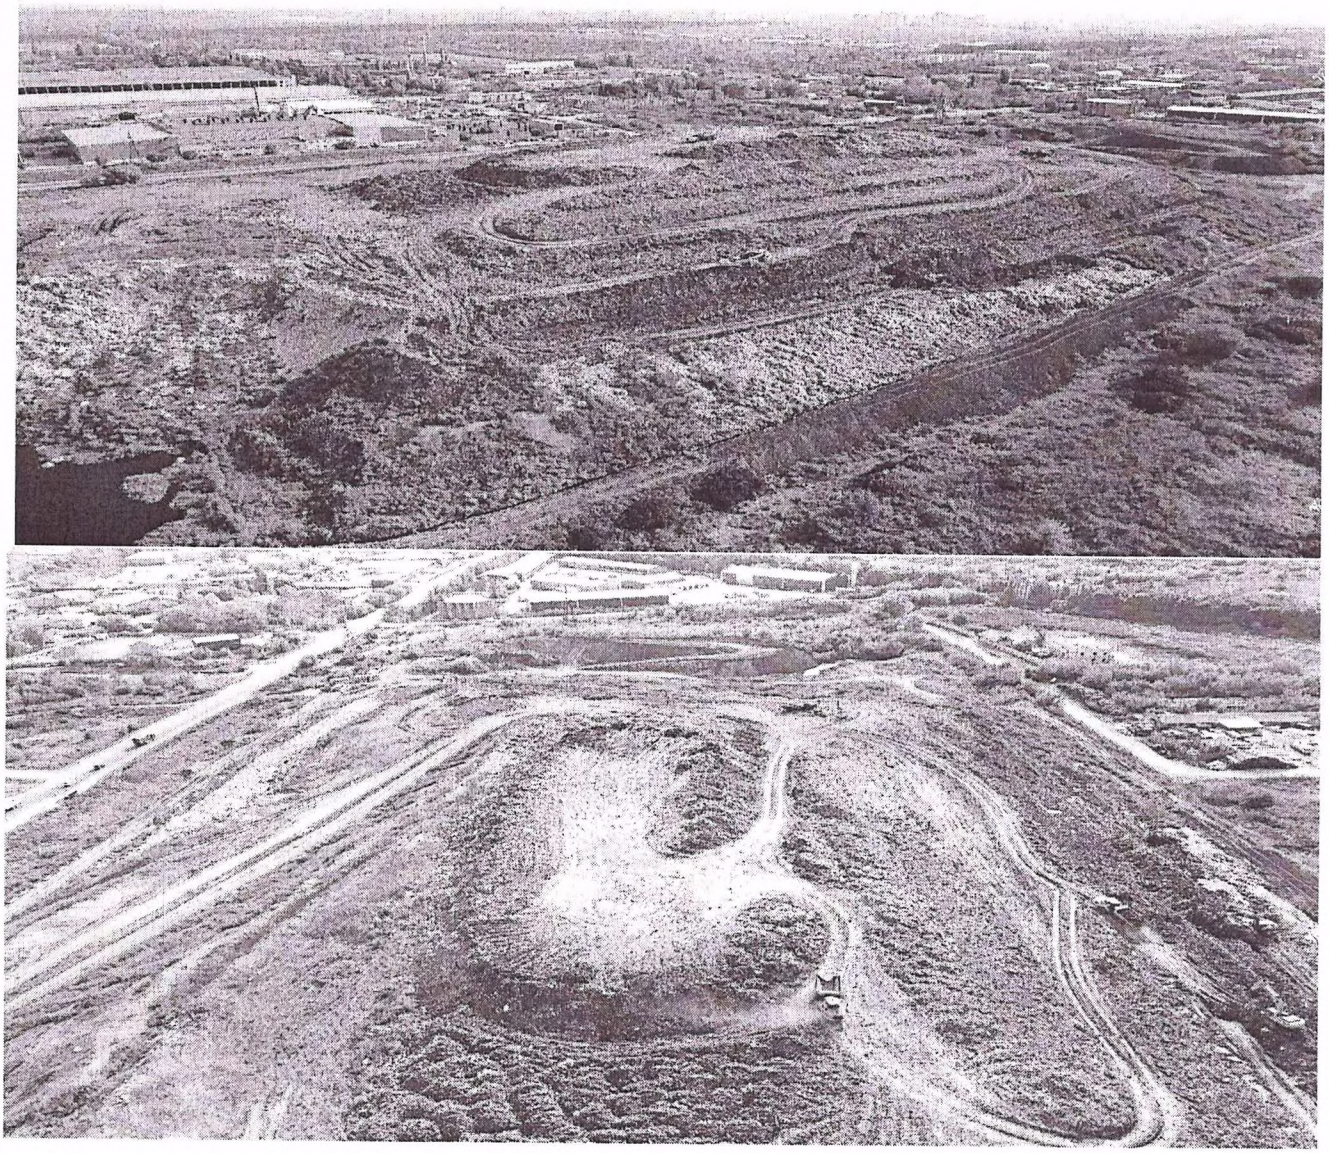

09.10.2023

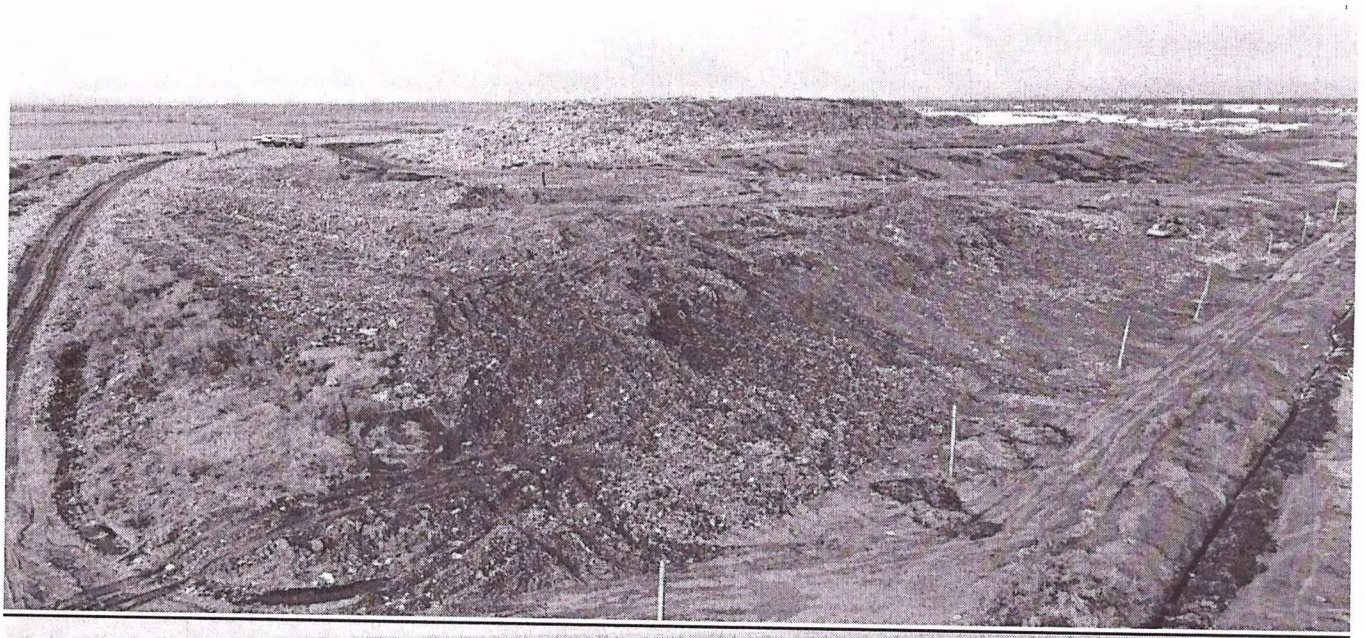

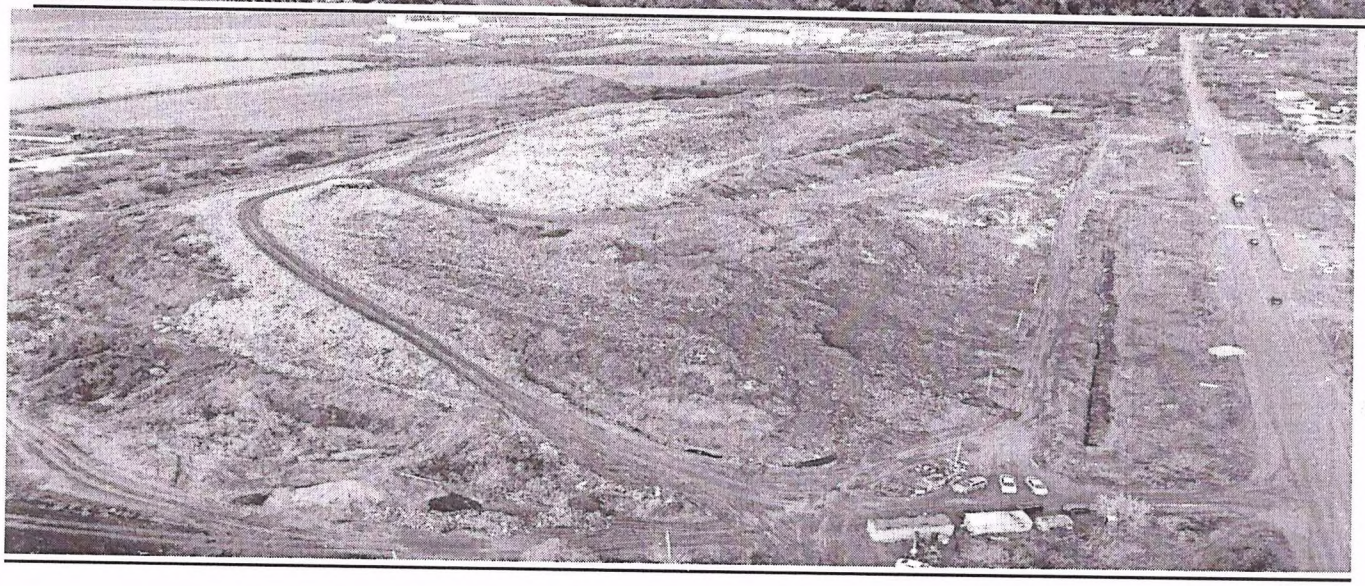

16.10.2023

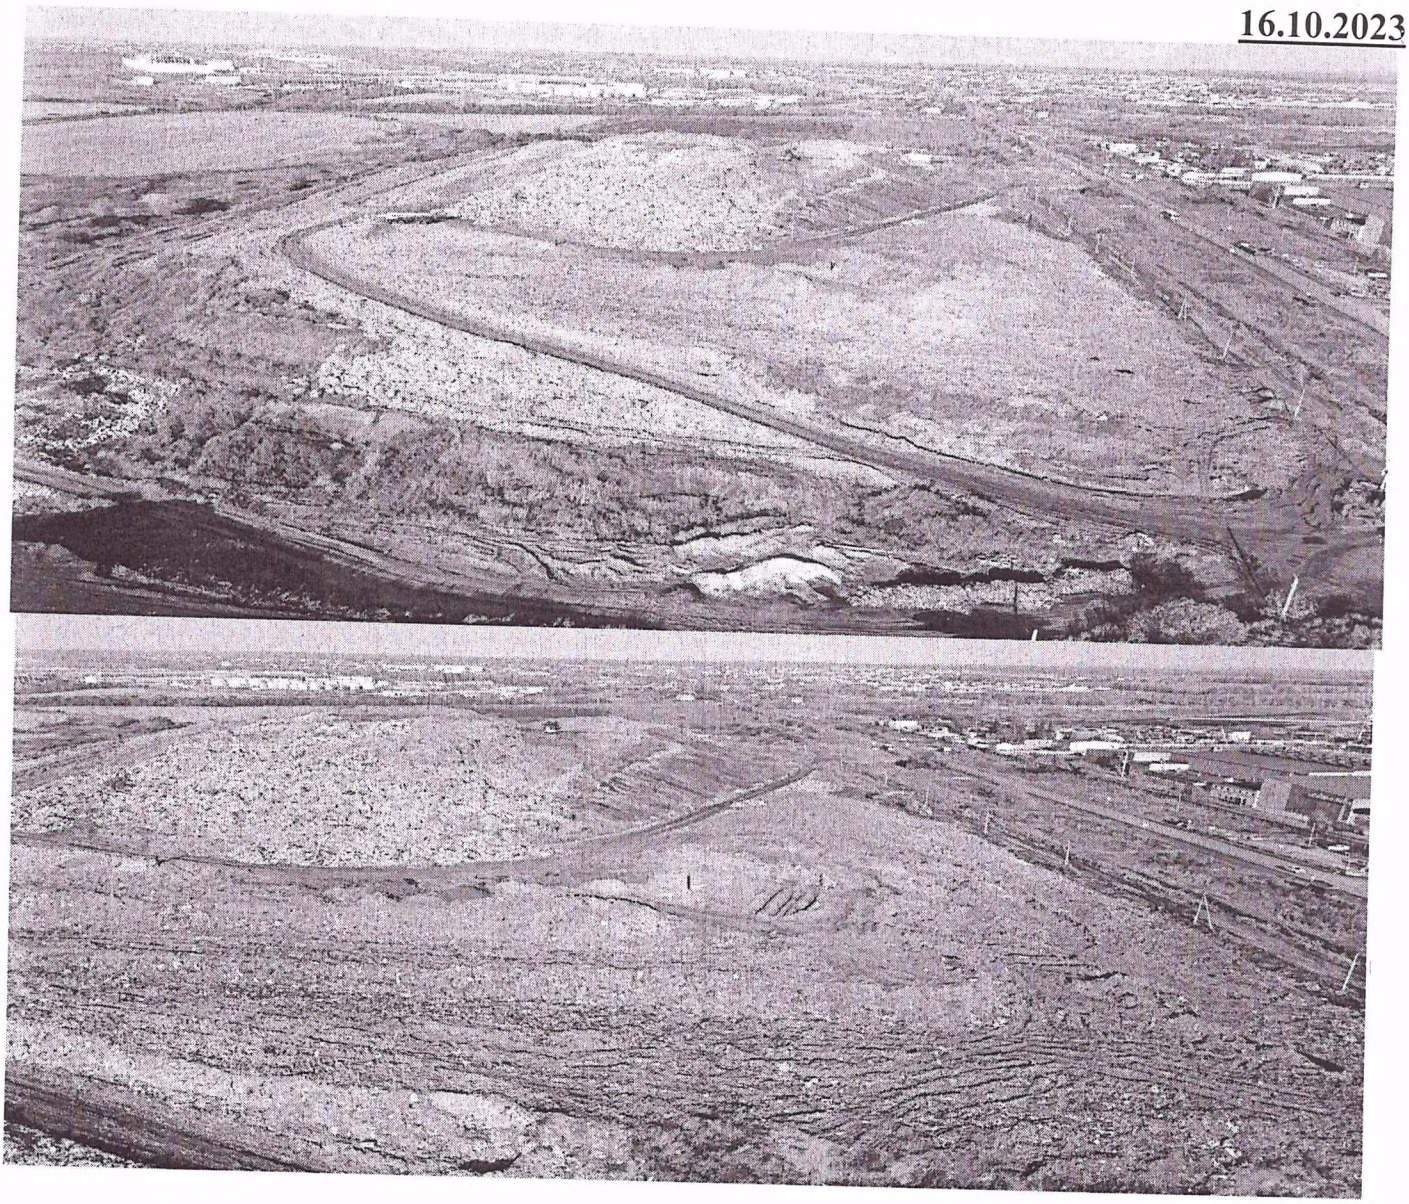

25.10.2023

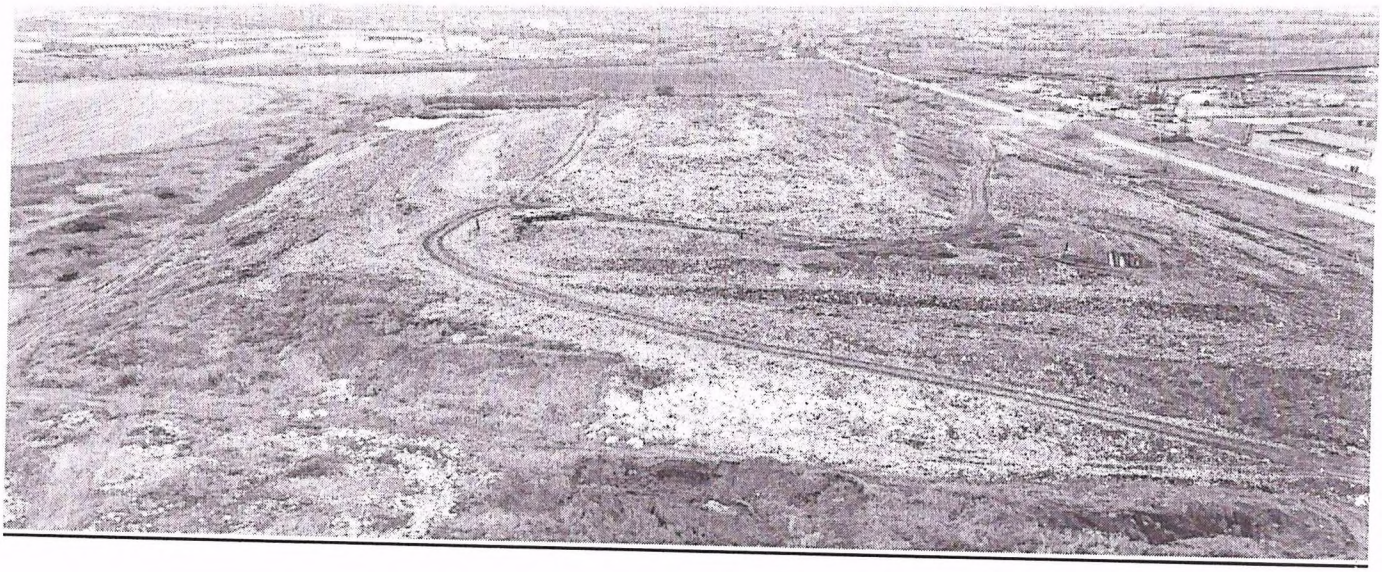

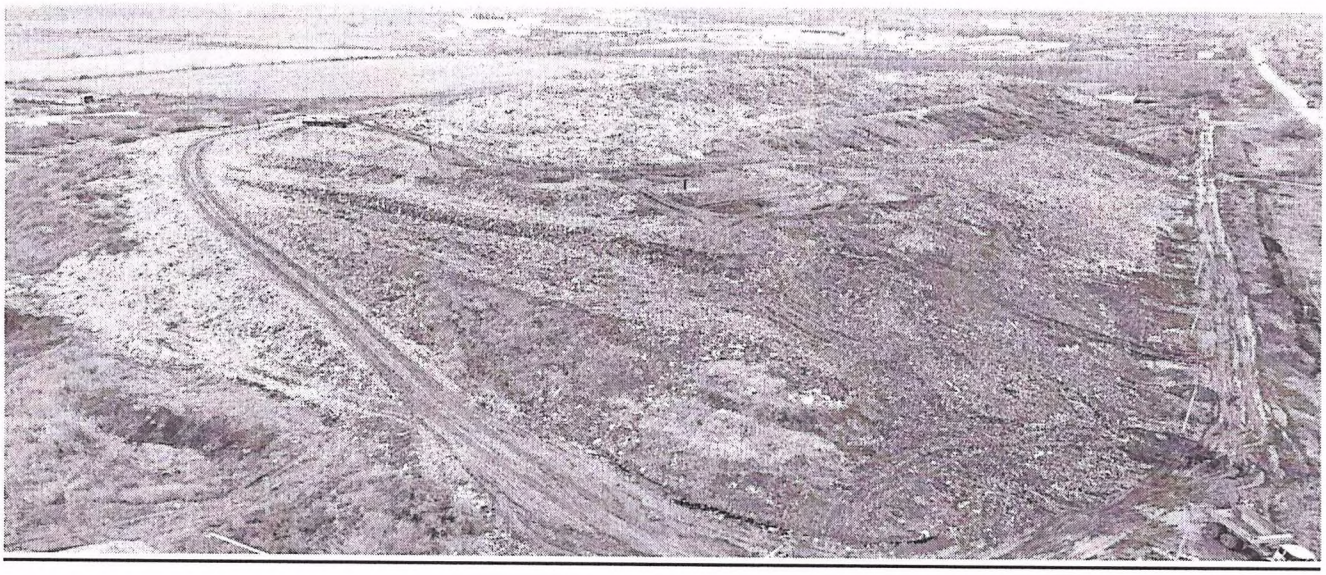

31.10.2023

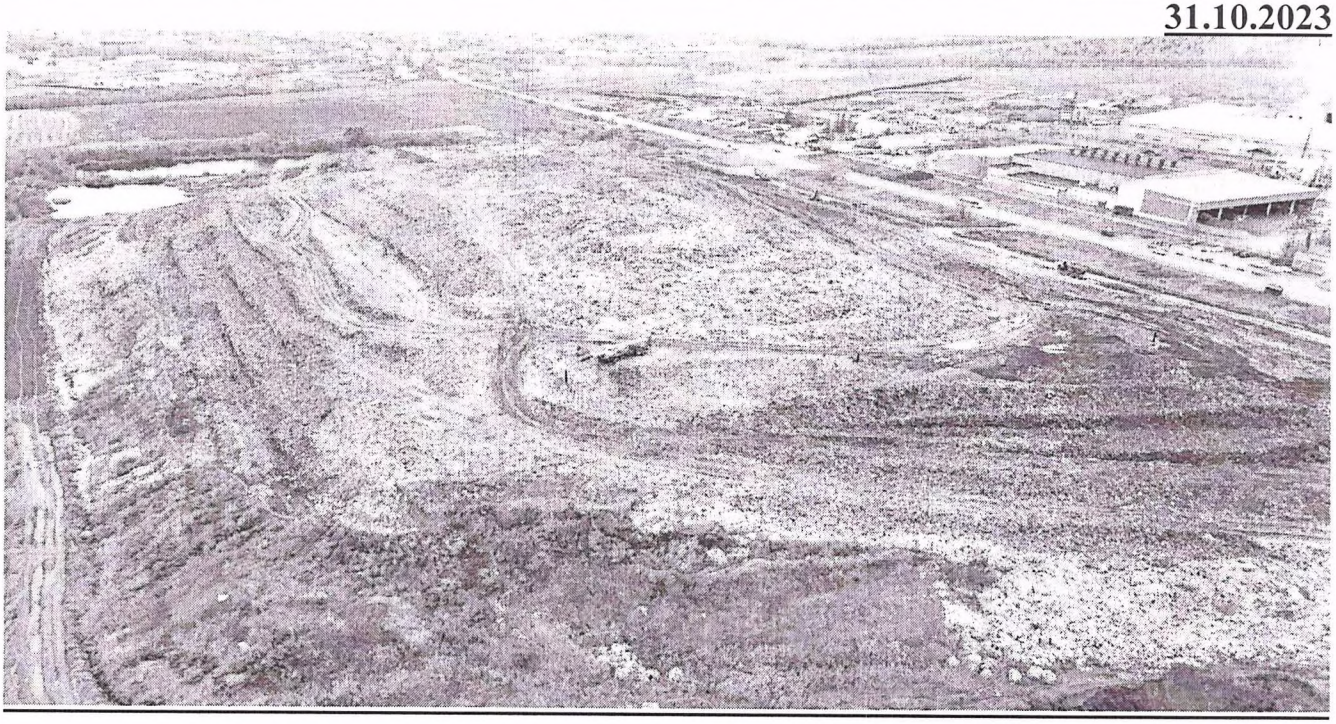

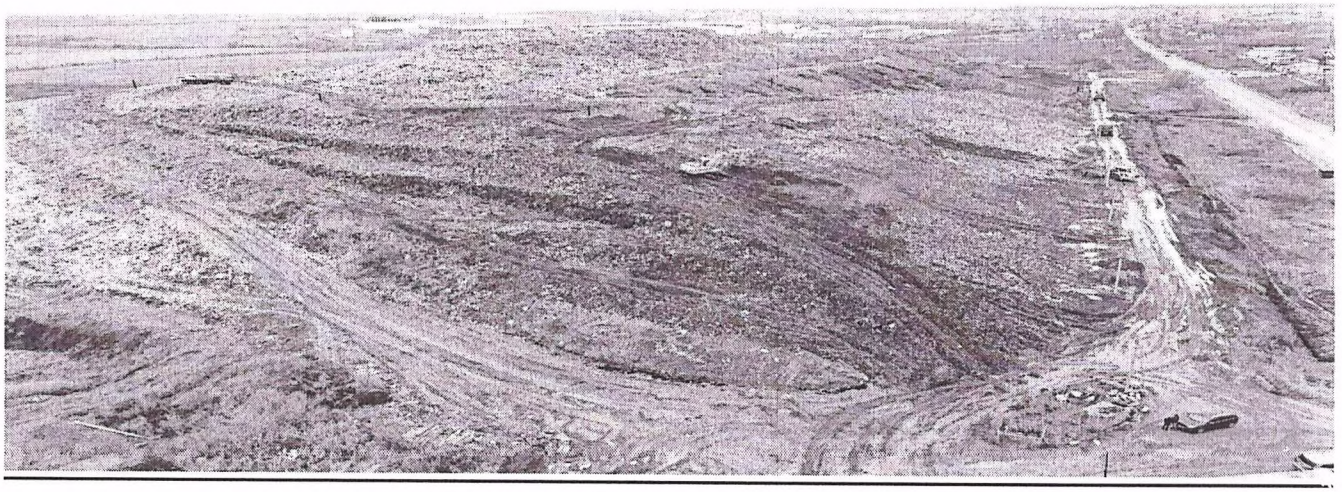

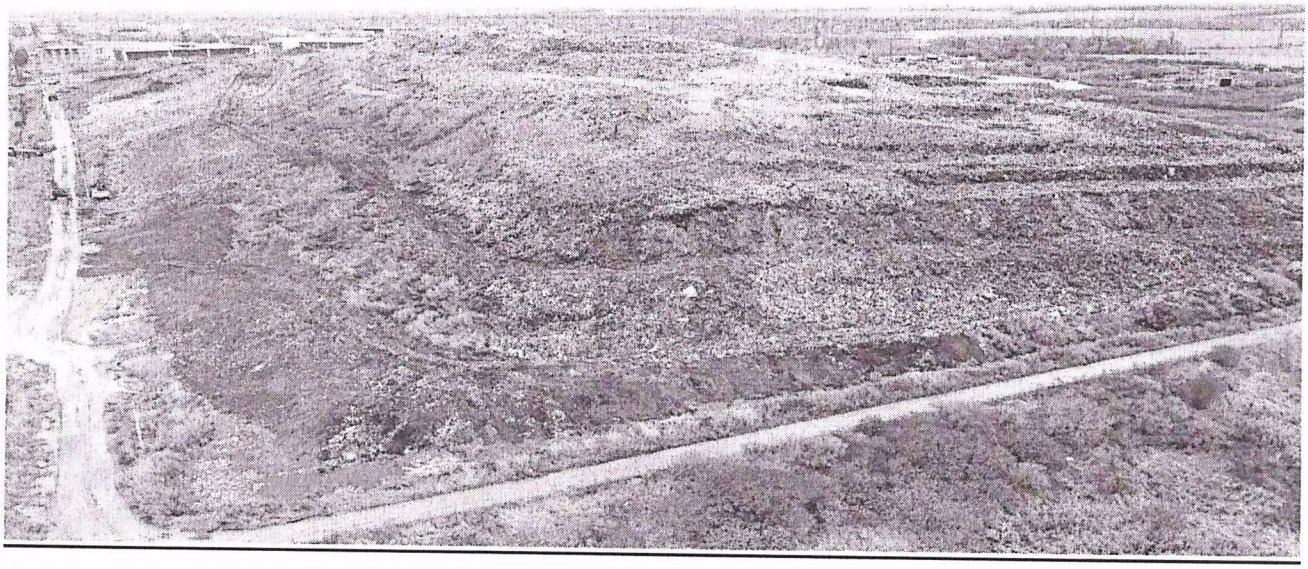

07.11.2023

14.11.2023

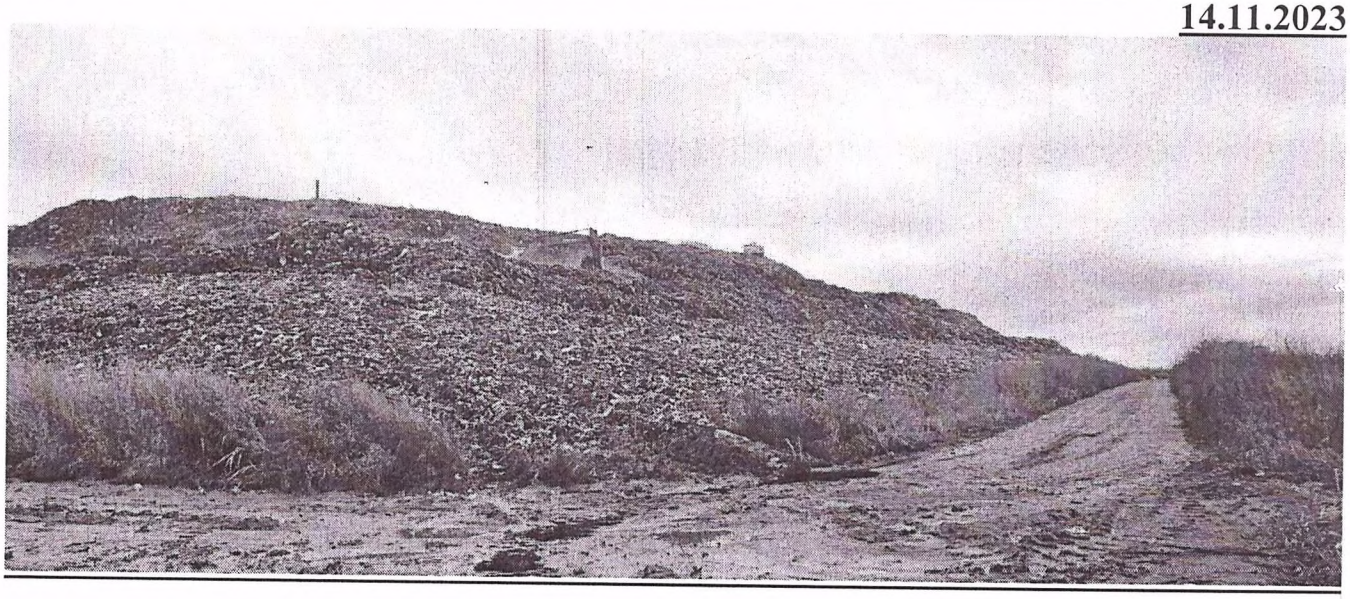

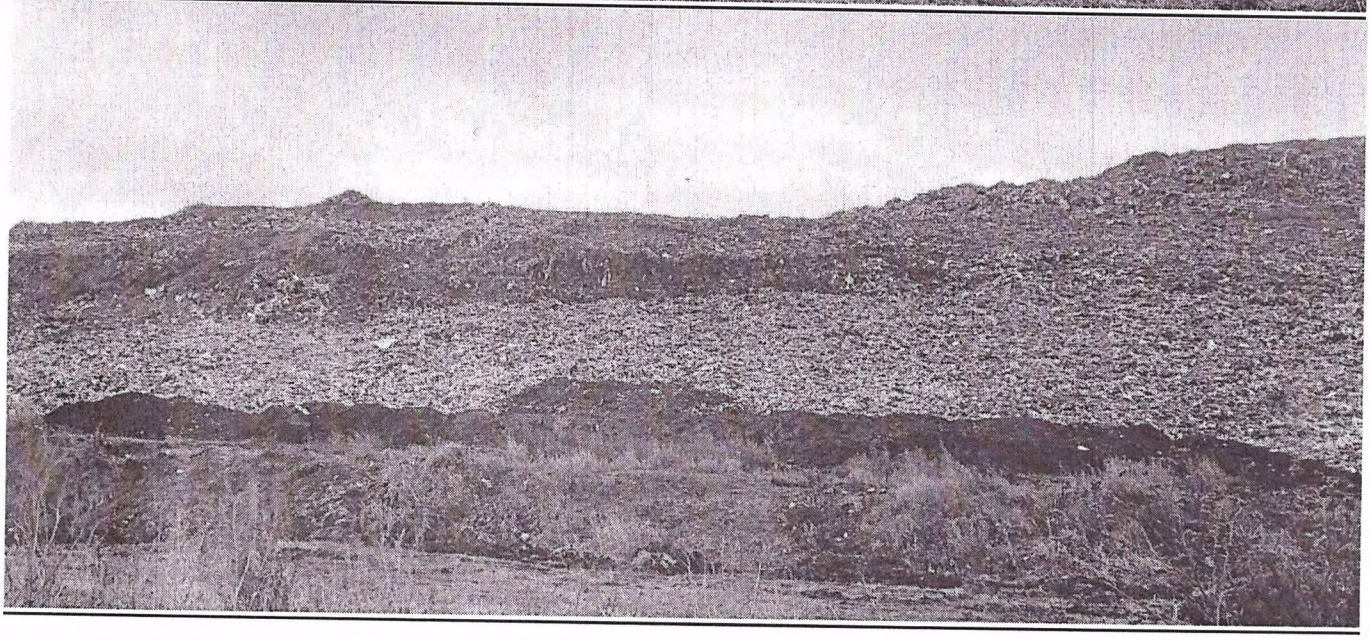

27.11.2023

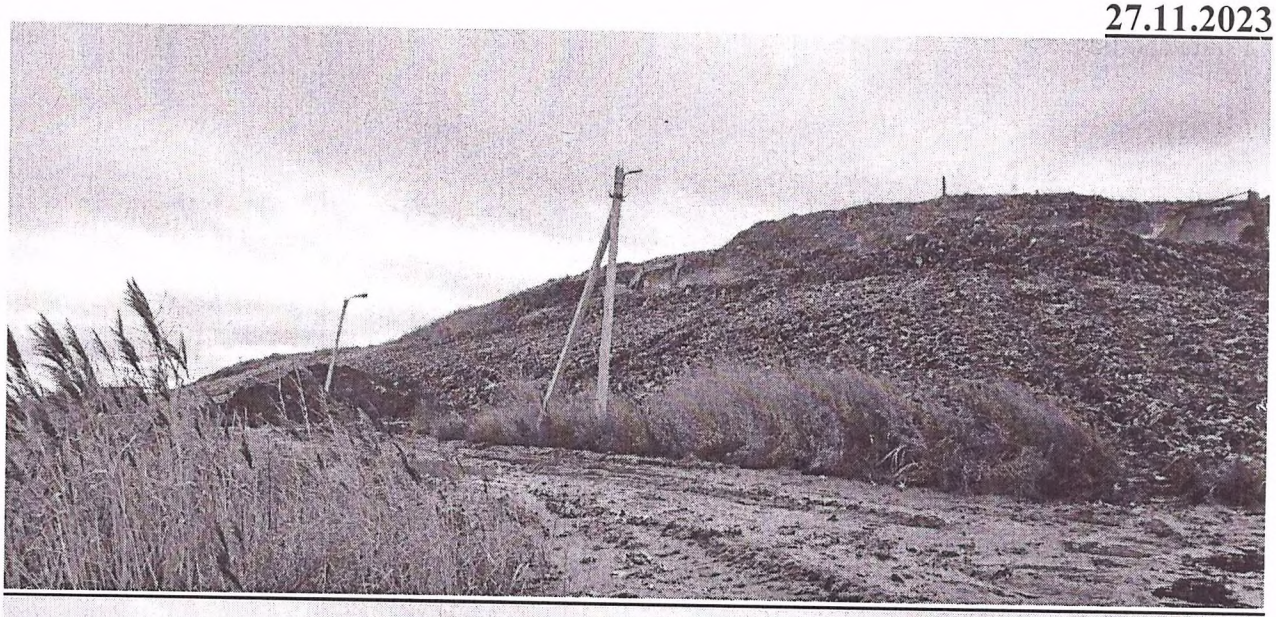

04.12.2023

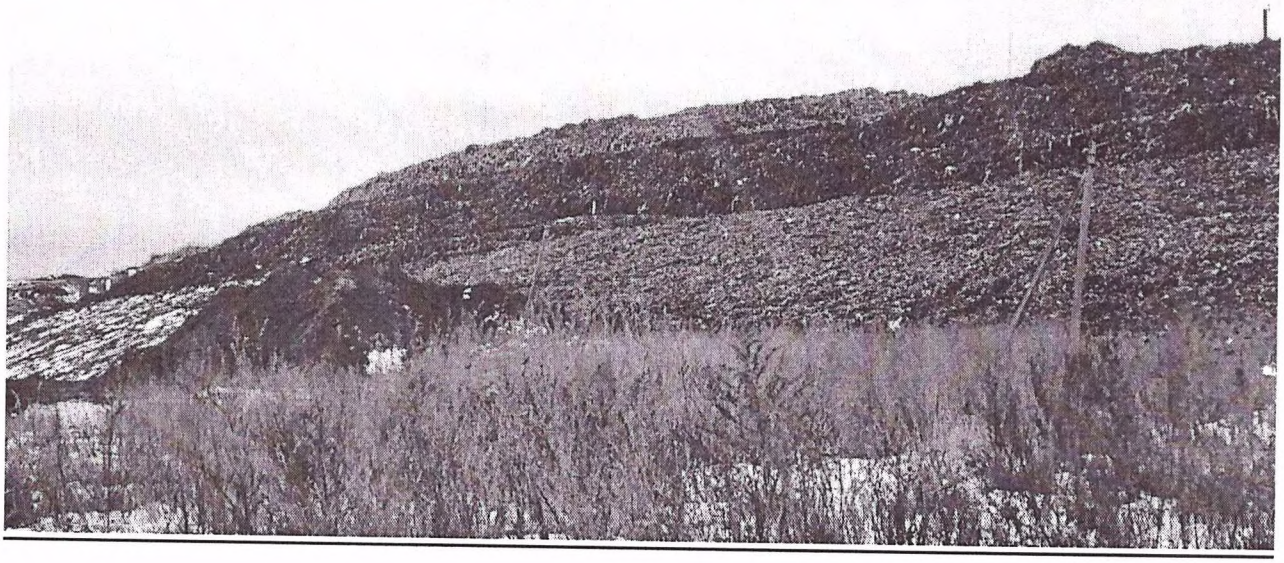

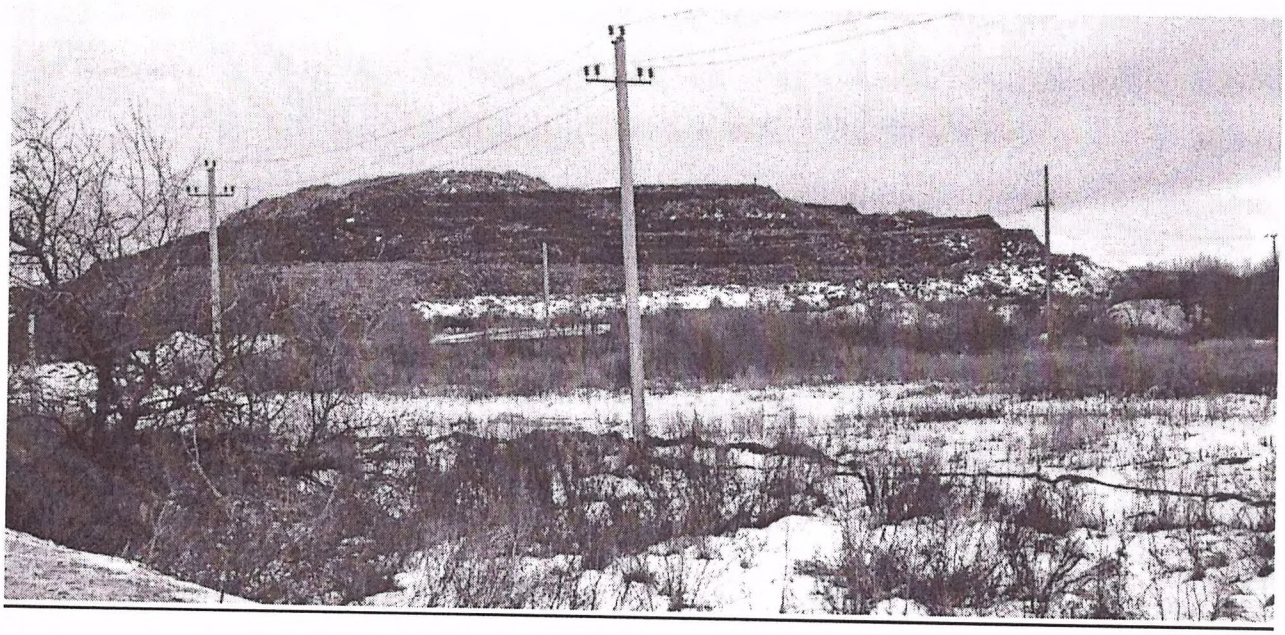

27.12.2023

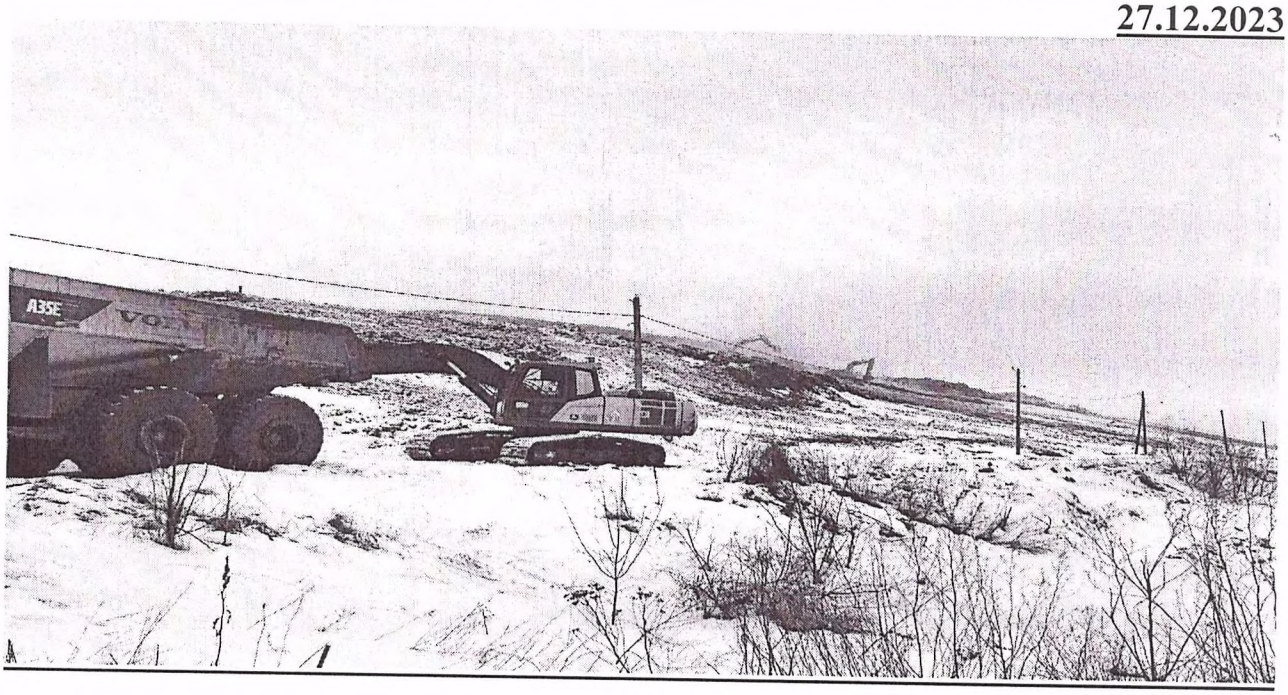

17.01.2024

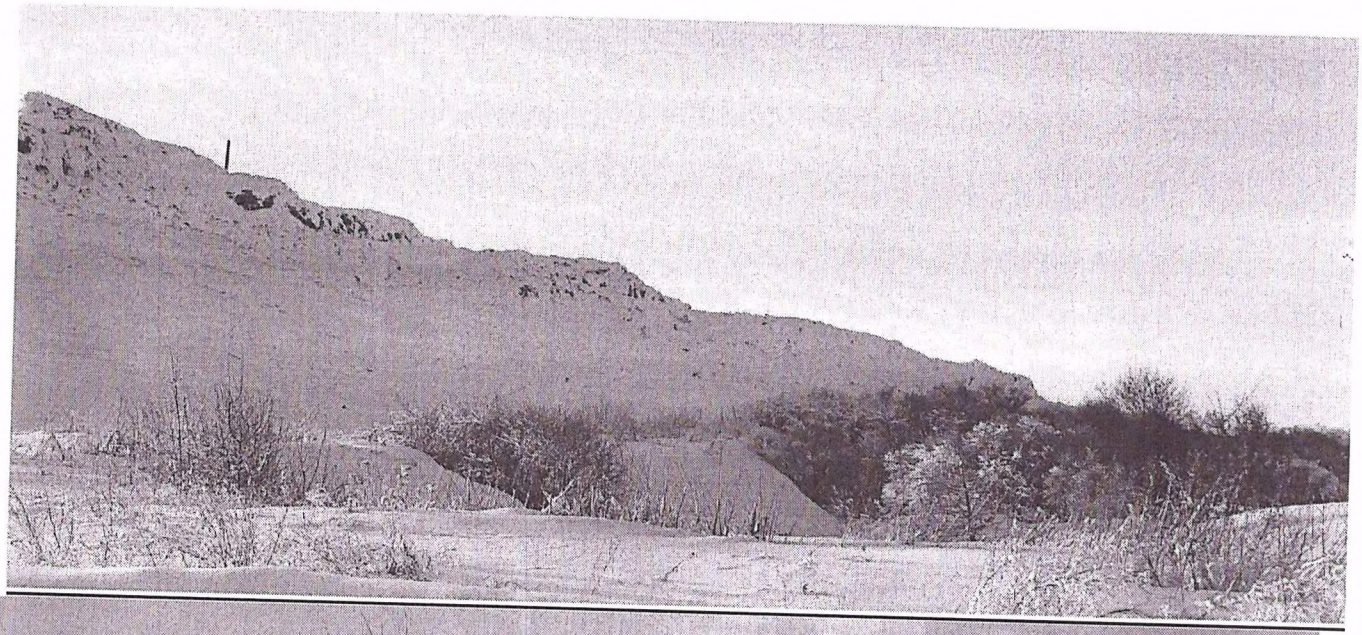

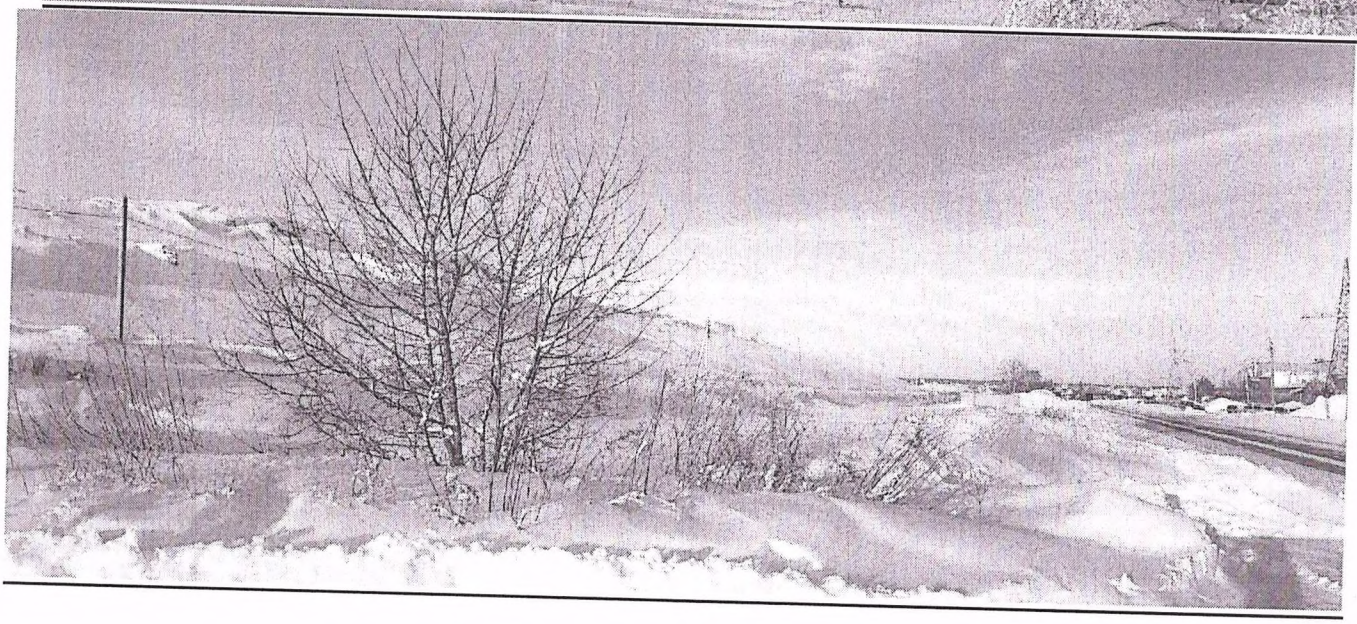

28.02.2024

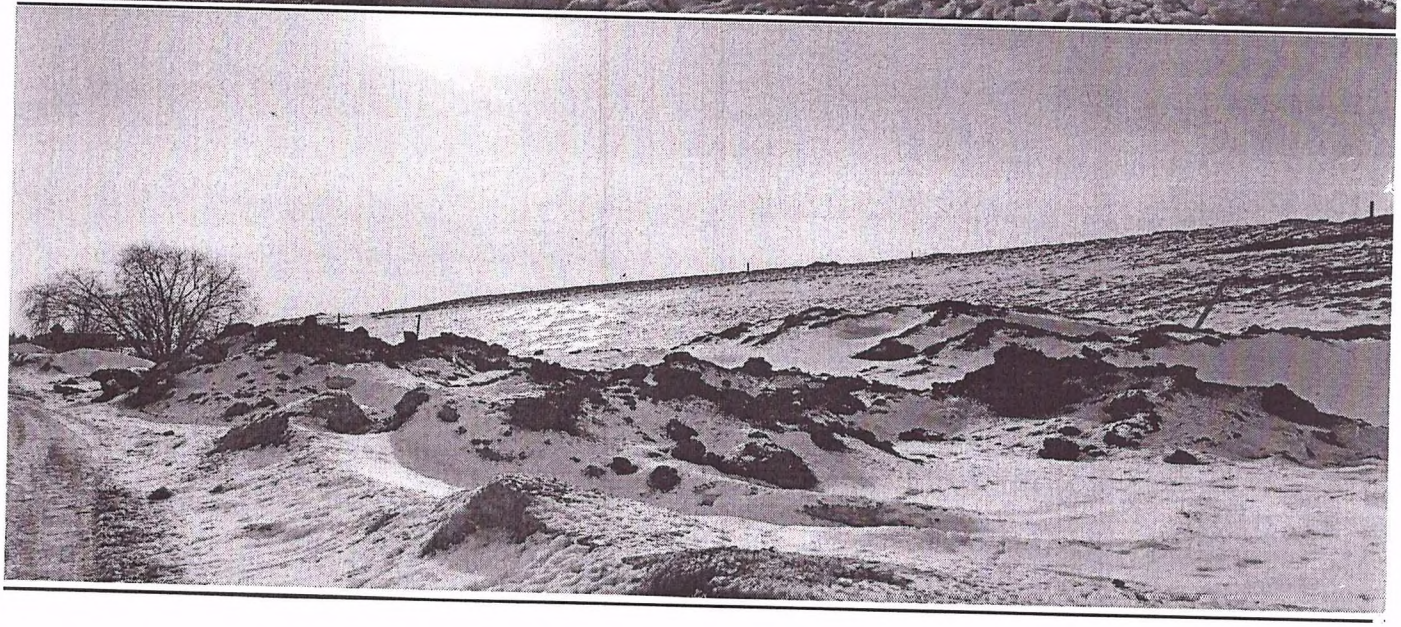

25.03.2024

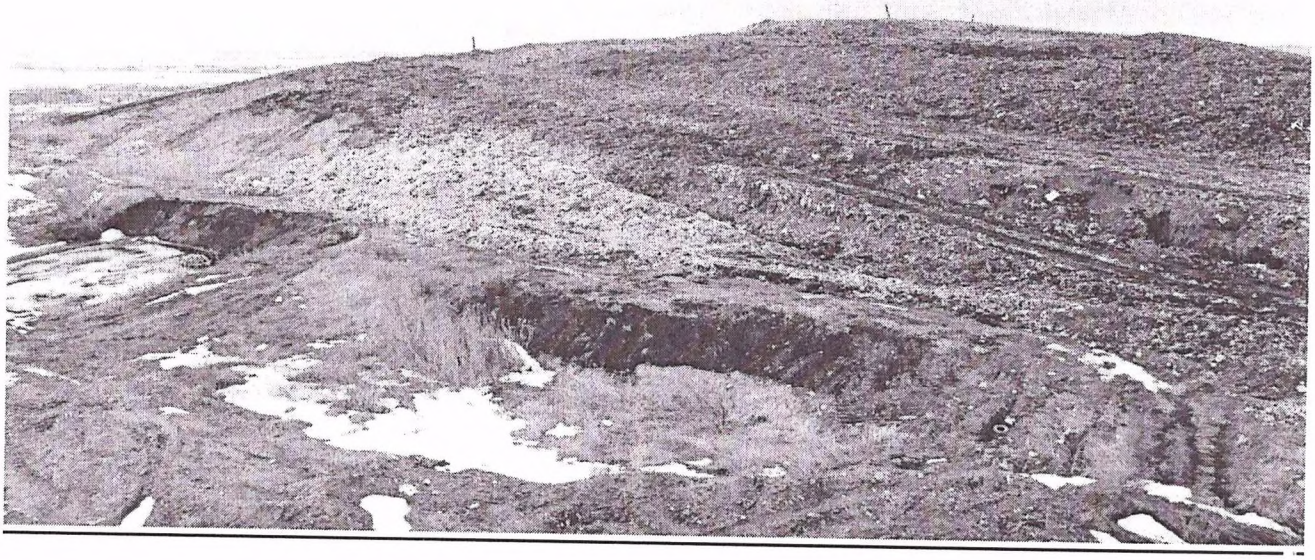

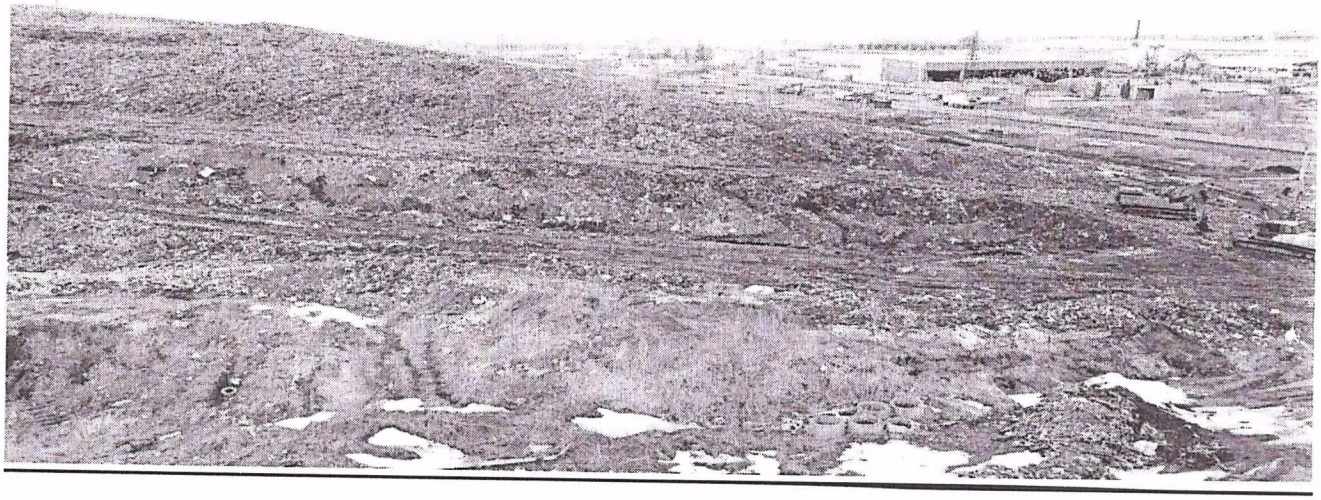

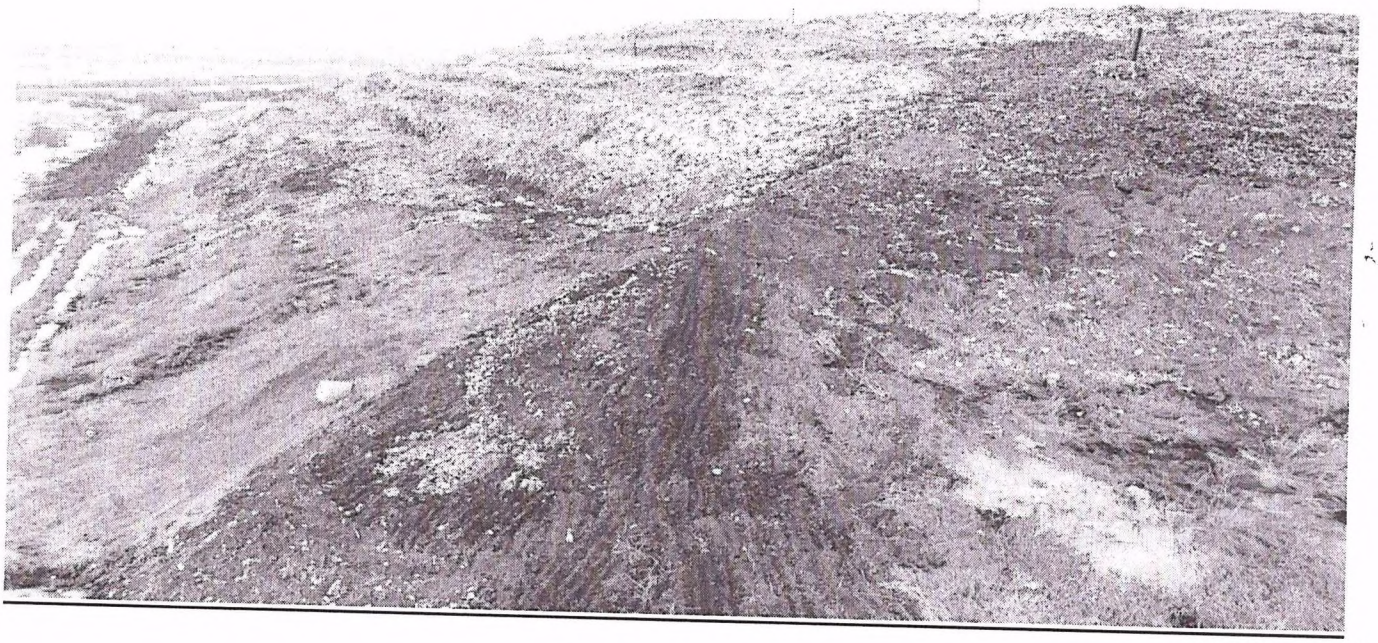

25.04.2024

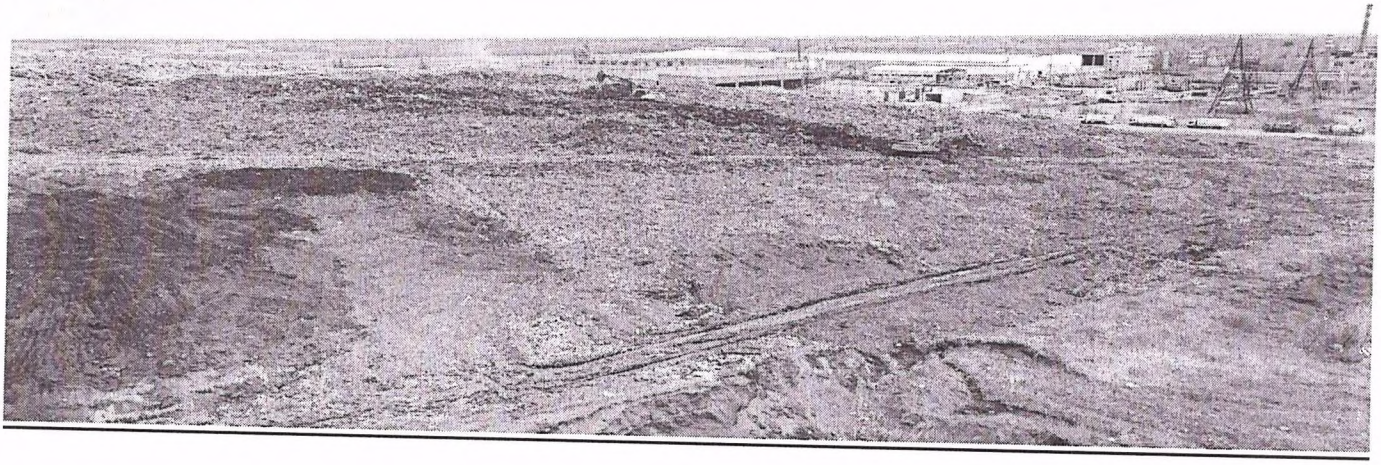

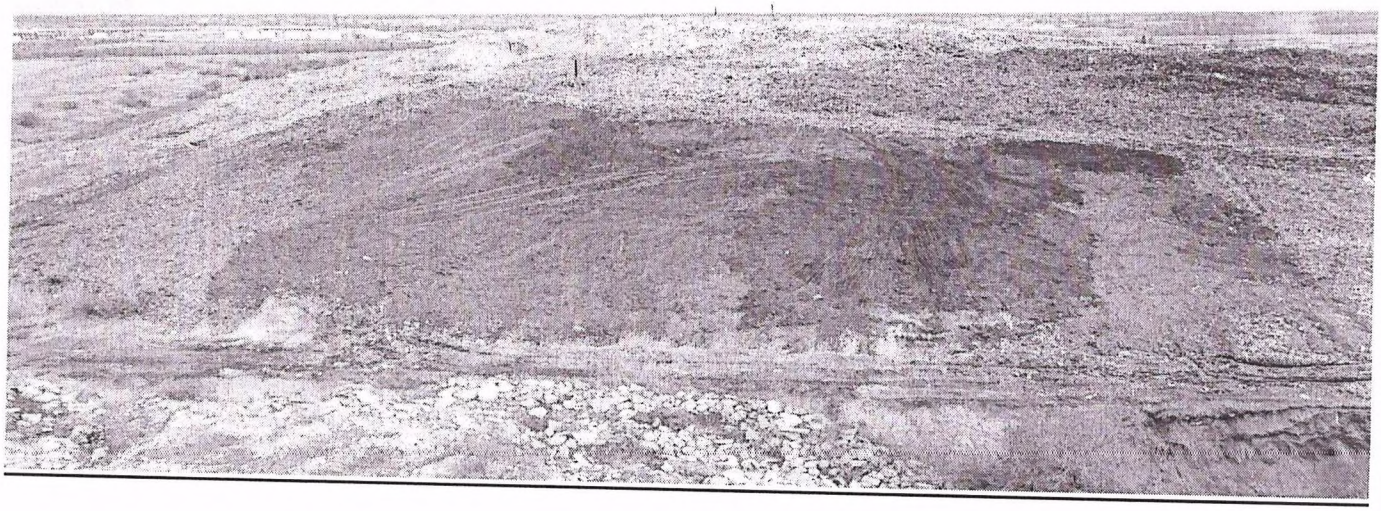

15.05.2024

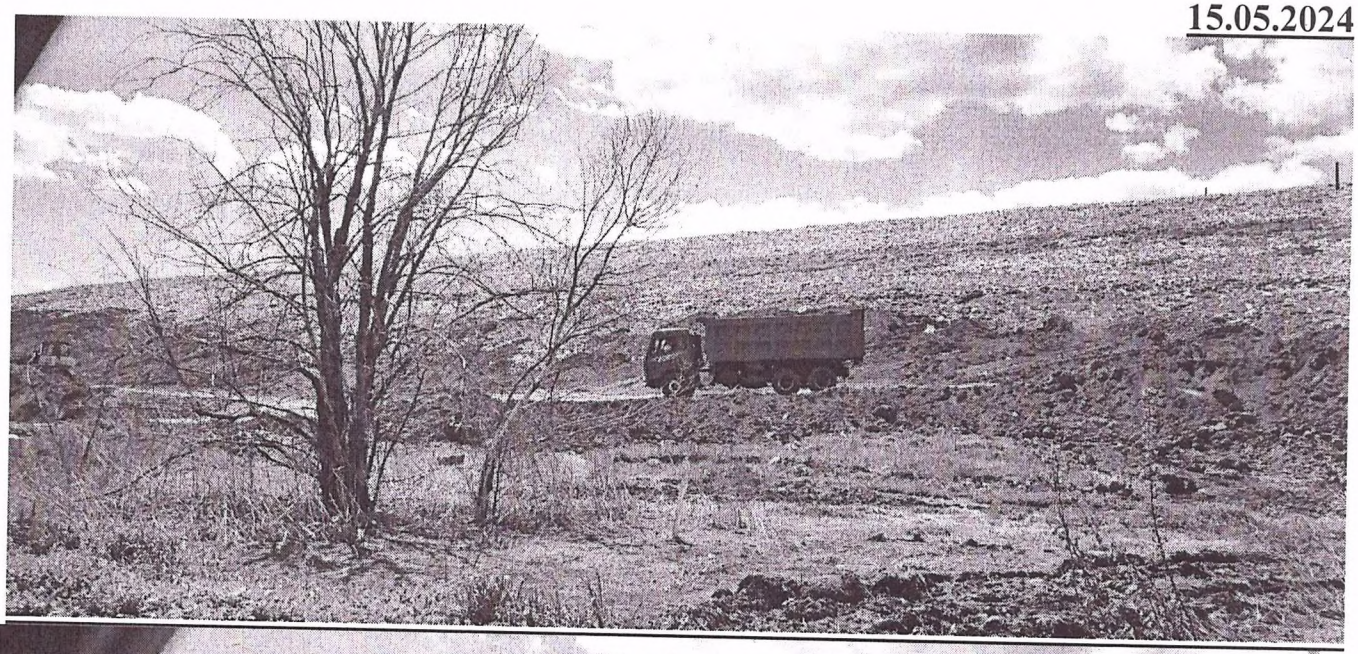

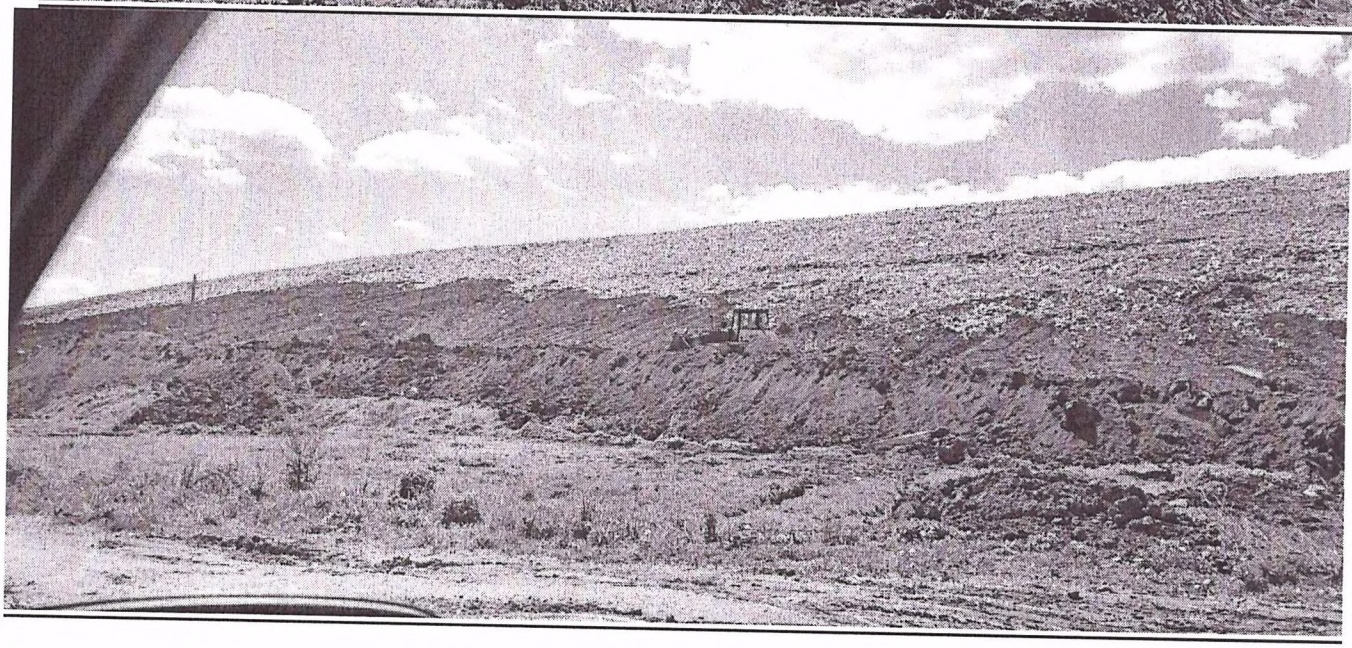

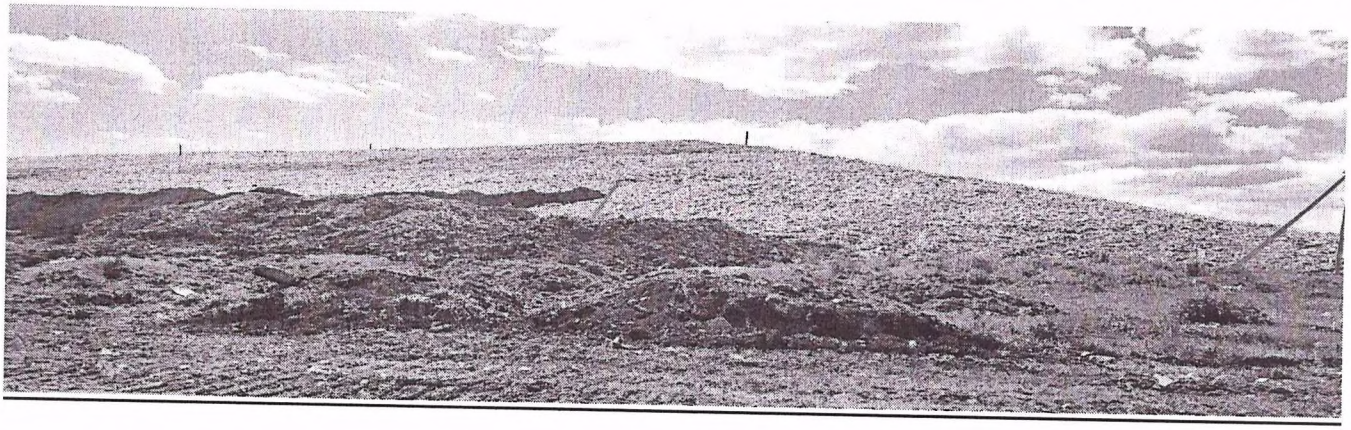

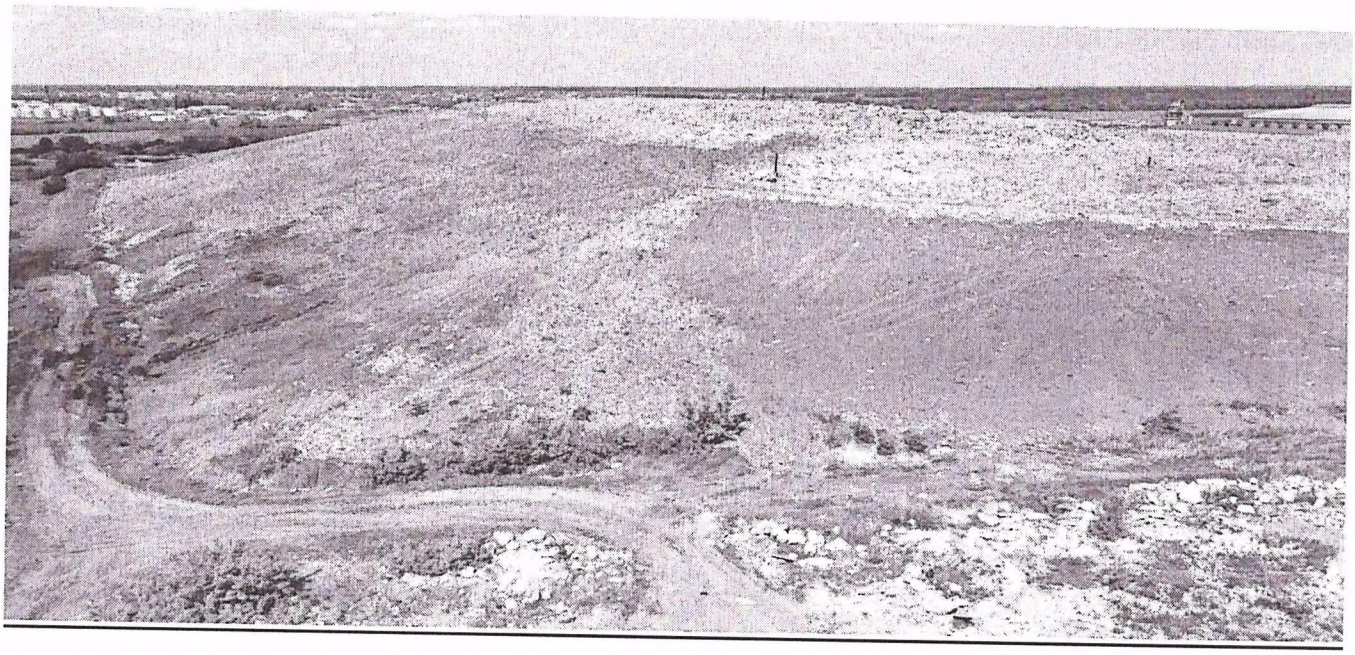

14.06.2024

15.07.2024

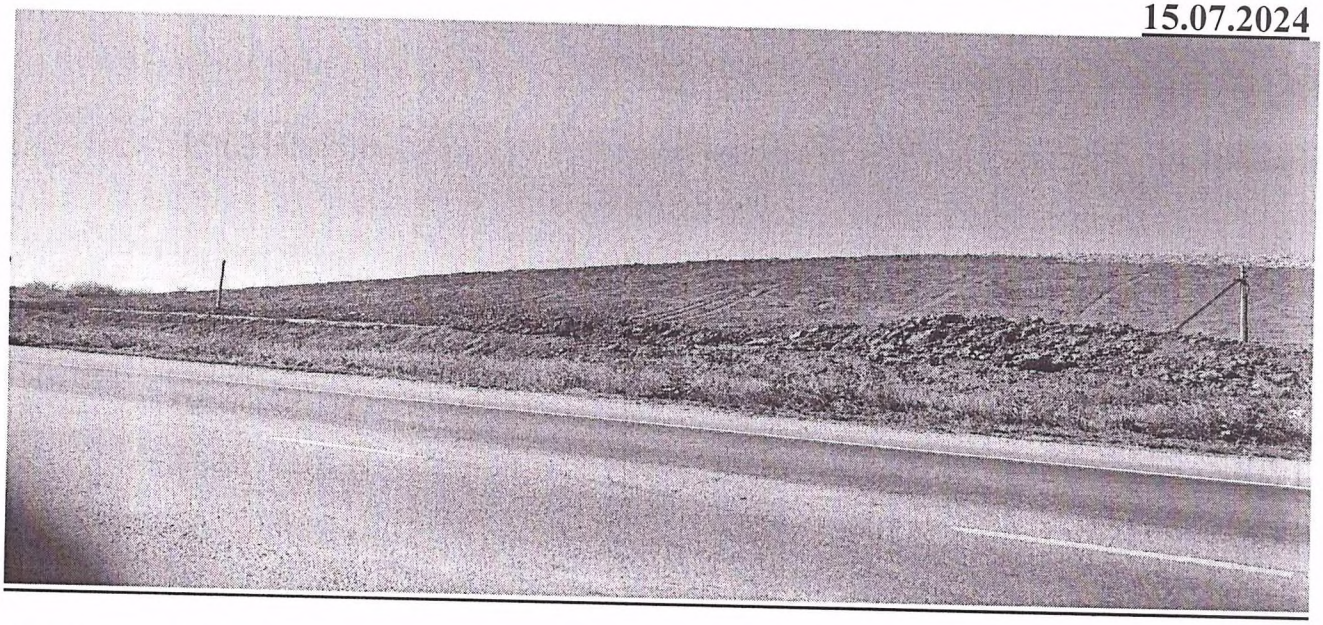

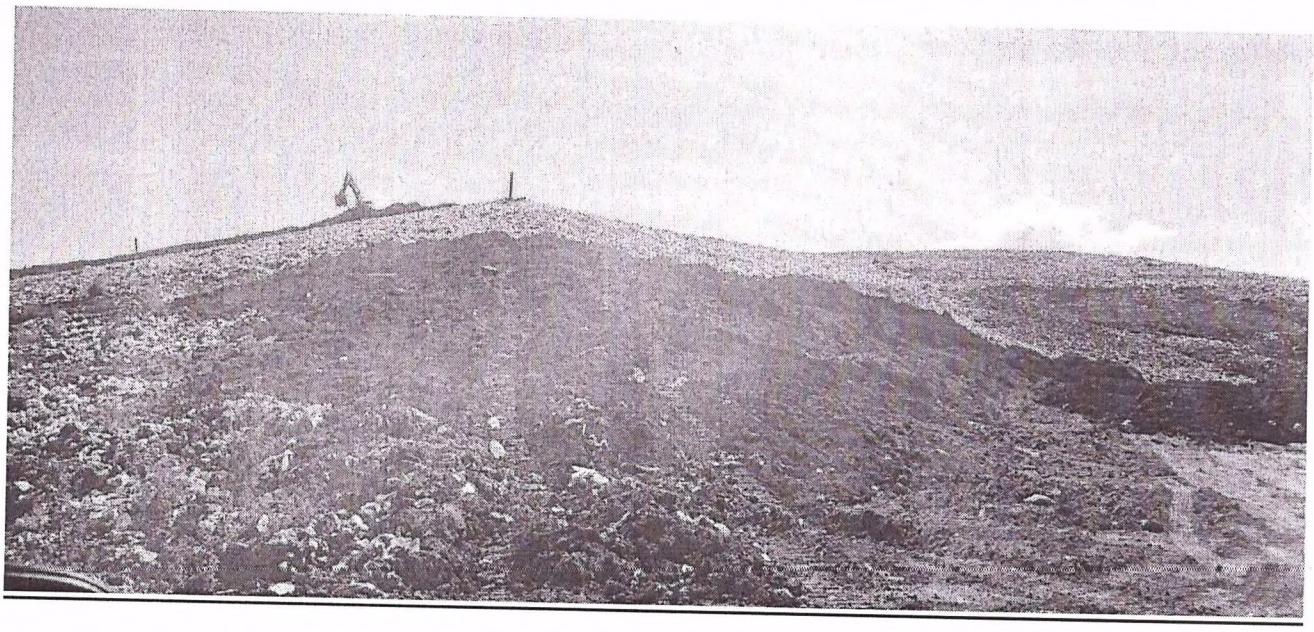

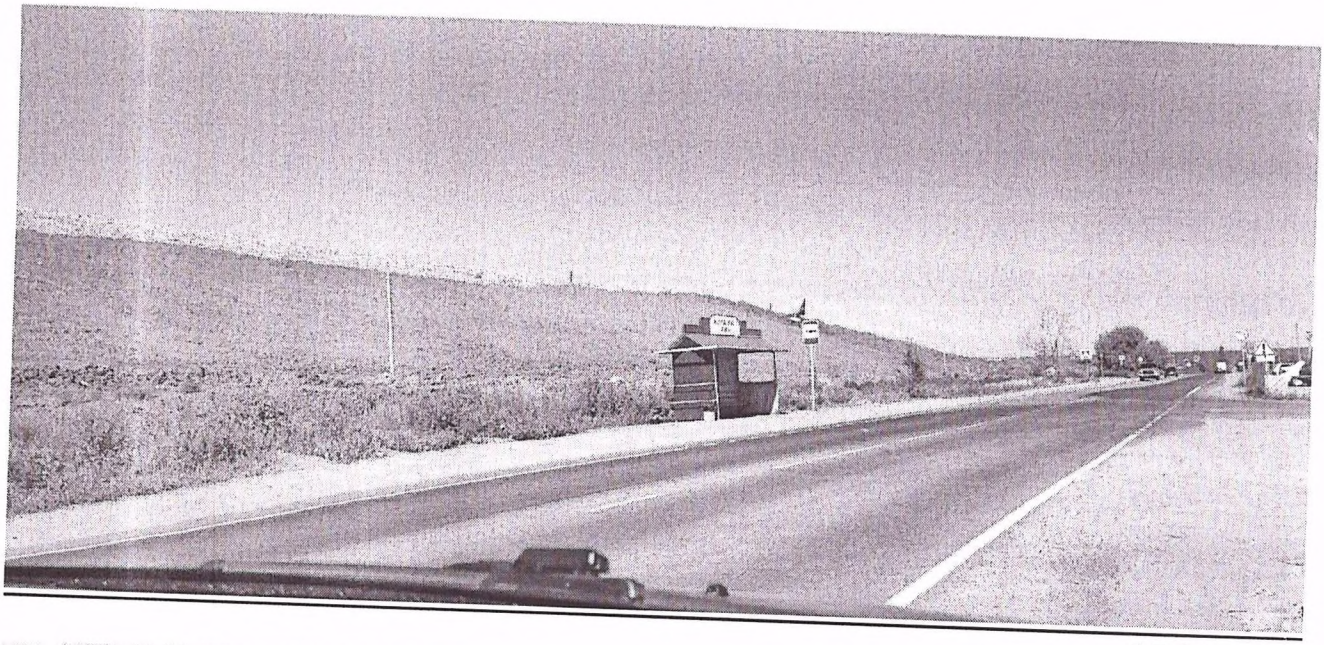

15.08.2024

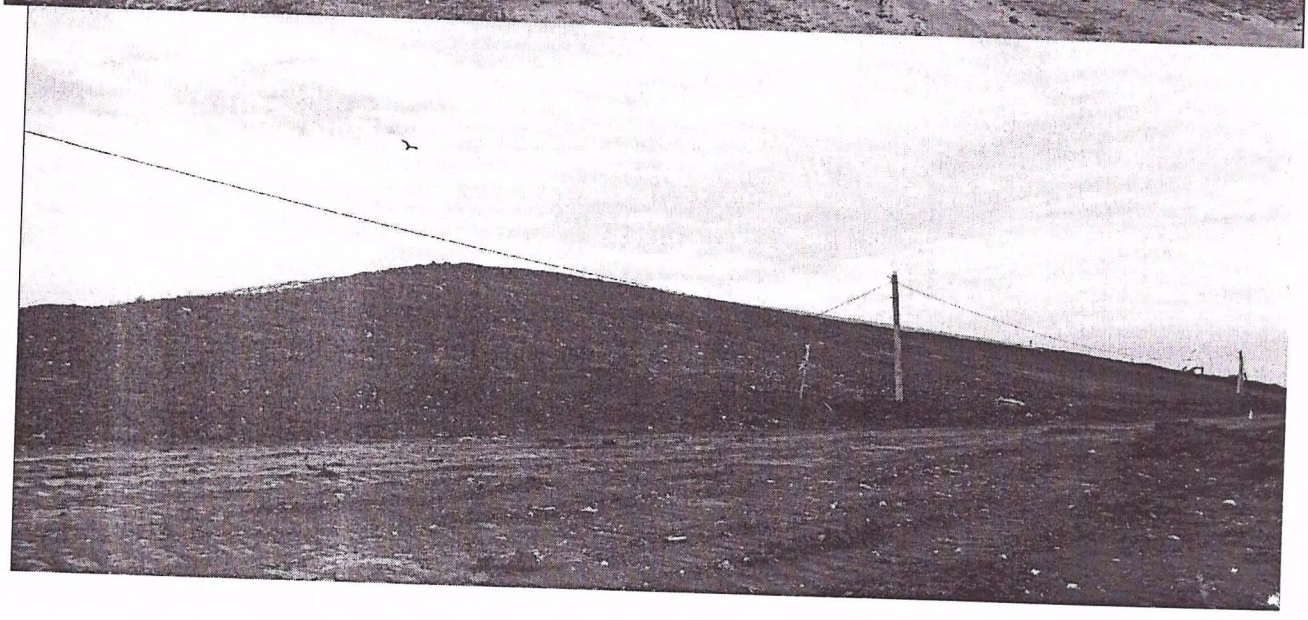

Справочно:

Вывод: на дату выездного мониторинга работы ведутся. Техника работает. Работы по формированию тела полигона «Центролит» выполнены. Ведутся работы по изоляции откосов глинистым грунтом. Также ведутся работы по устройству нижнего изолирующего слоя и верхнего рекультивационного слоя. Осуществляется завоз глинистого и плодородного грунтов.

Выявлено:

1. График работ по рекультивации земель, нарушенных при складировании отходов производства и потребления в виде брикетов высокой плотности на полигоне «Центролит», указанный в Дополнительном соглашении № 1 от 29.12.2023 к Договору на выполнение работ по рекультивации № 05/09/23 от 05.09.2023, в Дополнительном соглашении № 2 от 29.12.2023 к Договору на выполнение работ по рекультивации № 05/09/23 от 05.09.2023 содержит не полный перечень работ по техническому этапу рекультивации, предусмотренных Проектом рекультивации 20.03.00-ПРЗ.
2. Работы по завозу изолирующего слоя грунта и планировке территории полигона «Центролит» были продлены до 15.08.2024 в соответствии Дополнительным соглашением № 2 от 29.12.2023 к Договору на выполнение работ по рекультивации № 05/09/23 от 05.09.2023. По состоянию на 15.08.2024 работы в полном объеме не выполнены.
3. Ведутся работы по новому договору на выполнение работ по рекультивации № 19/06-2024 от 19.06.2024. По состоянию на 15.08.2024 работы в полном объеме не выполнены.
4.

5. Техника работает.

Риски: Договор на выполнение работ по рекультивации № 05/09/23 от 05.09.2023, содержит не полный перечень работ по техническому этапу рекультивации, предусмотренных Проектом рекультивации 20.03.00-ПРЗ.

Общий срок рекультивации в соответствии с Проектом рекультивации 20.03.00-ПРЗ превышает срок действия Концессионного соглашения.

Работы, сроком исполнения до 15.08.2024 выполнены не в полном объеме.

Заместитель председателя-начальник
управления стратегического развития
департамента экономического развития
администрации г. Липецка Н.И.Игнатенко
